


집수정 내부에서 작업하던 재해자가 황화수소 중독(추정)으로 사망 [사망1]

공 정 명	OO농장 분뇨 이송작업	발생일시	2023. 9. 4.(월) 14:13경
재해형태	중독(추정)	재해정도	사망 1명
소 재 지	전북 고창군	공사규모	-
재해개요	'23.9.4.(월) 14:13경 전라북도 고창군 소재 OO농장에서 막힌 분뇨 이송배관을 뚫기 위해 재해자가 집수정 내부로 진입하던 중, 황화수소 중독(추정)에 의해 사망함.		

재 해 상 황 도

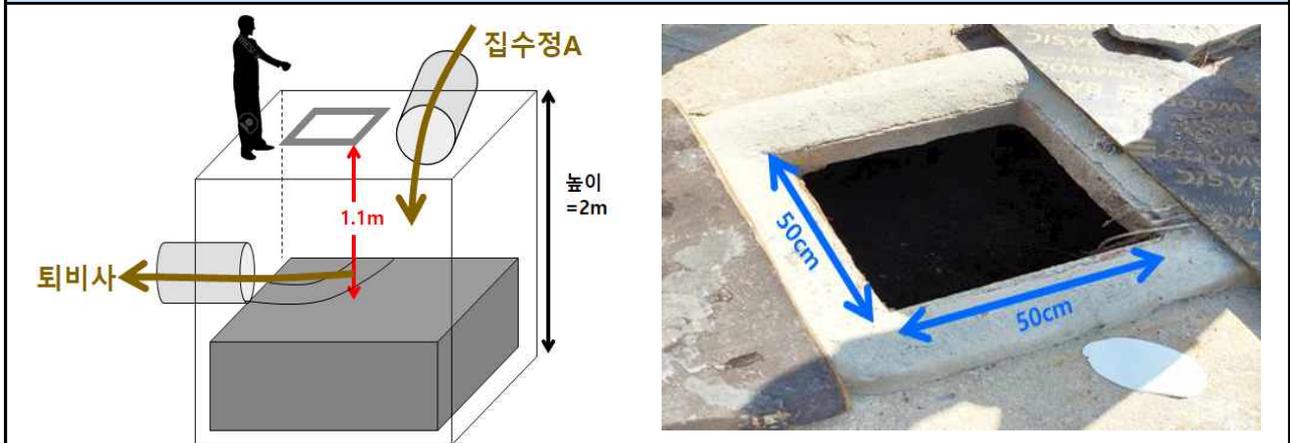

분뇨 이송을 위해 집수정B 진입

집수정B 내부에서 중독(추정)

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설비 보수 등의 작업 시 안전조치 실시 및 안전한 작업방법 등의 주지 <ul style="list-style-type: none"> - 분뇨 등의 배관을 청소하는 작업 시, 작업방법 및 순서를 정하여 이를 미리 근로자에게 주지하고, 황화수소 중독 방지에 필요한 지식을 가진 사람을 지휘자로 지정하여 작업해야 함. ○ 밀폐공간 작업 관련 재해예방조치 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 밀폐공간 작업 프로그램을 수립 및 시행하고, 진입 전 밀폐공간 내부가 적정공기 상태가 유지되는지 확인 한 후 호흡용 보호구 (송기마스크, 공기호흡기 등)를 착용하여 작업해야함. ○ 개구부 방호 조치 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 집수정 상부의 개구부에 근로자가 출입 또는 추락하지 않도록 안전난간, 울타리, 덮개 등의 방호조치를 하여야 함. ○ 위험성평가 작성 및 이행 철저
------	--
