


# 몰드커버 무너짐으로 인한 깔림재해 (사망1명)

## 재 해 개 요

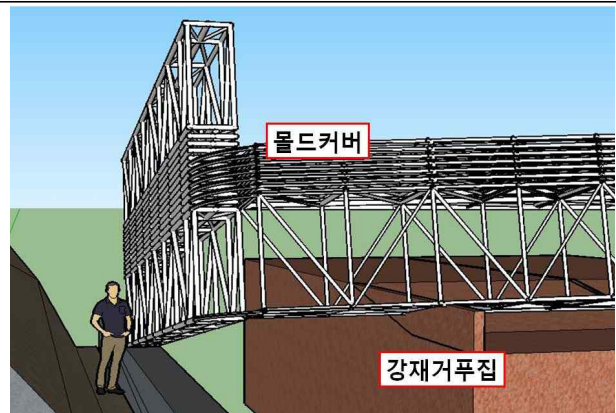

2017. 01. 19.(목) 10시 10분 경 ILM 제작장 몰드커버에 체결되어 있던 슬링벨트의 위치조정을 위해 재해자가 몰드커버를 따라 이동하던 중 몰드커버가 재해자 방향으로 넘어가면서 몰드커버에 작업자가 깔려서 사망함.

## 재해발생원인

- 몰드커버 상부에서 동시작업(거푸집바닥면 절단작업)
- 몰드커버 이동 작업 시 신호수 미지정
- 작업 전 안전교육 미실시
- 몰드커버 해체작업에 대한 작업계획 미수립

## 재해예방대책

- 구조물 이동시 동시작업금지
  - － 동시작업 시 각각의 작업에 영향을 미치지 않는 경우에만 작업을 할 수 있도록 허용
- 구조물 이동 작업 시 신호수 지정
  - － 구조물 근처에 작업자가 있는 경우 감독자나 신호수를 두어 대피할 수 있는 신호체계구축
- 작업 전 안전교육실시
  - － 작업계획을 바탕으로 한 작업 전 안전교육실시
- 몰드커버 해체작업에 대한 작업계획수립
  - － 구조물 해체작업 시 사전 작업계획서 작성
