


교량거더 가조립 중 하부 연결철판이 떨어져 철판에 깔림 (사망)

공 정 명	(주)OO 교량박스거더 가조립	발생일시	2022. 1. 21.(금) 20:30경
재해형태		재해정도	사망 1명
소 재 지	전북 군산시	공사규모	-
재해개요	2022년 1월 21일 20:30분경 (주)OO0000 공장 내 교량거더 가조립 현장에서 사내협력업체인 (주)OO 소속 피재자가 2개의 거더박스 연결을 위해 하부에서 연결 철판의 볼트 너트 체결작업중 연결 철판(중량 약800kg)이 갑자기 떨어지면서 피재자가 철판에 깔려 사망		

재 해 상 황 도

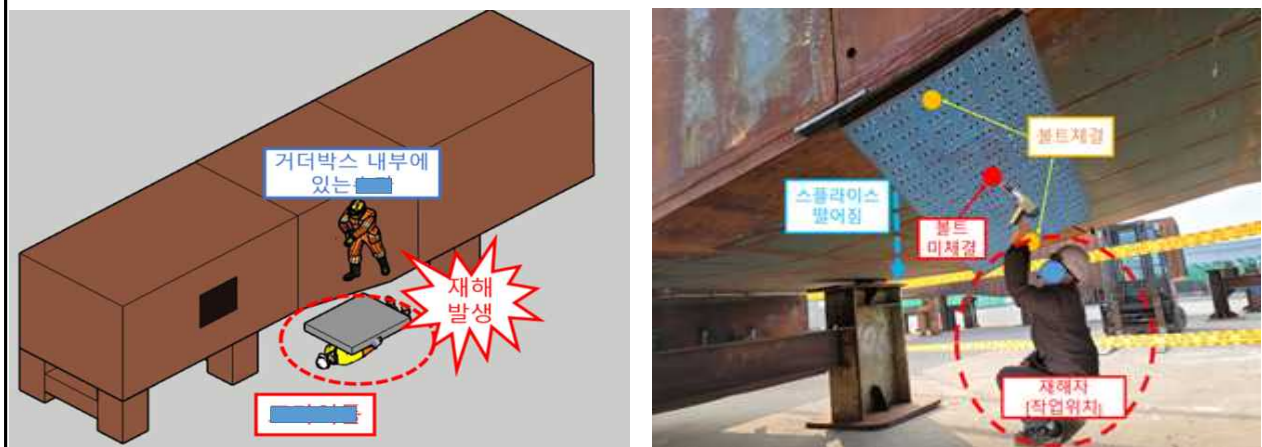

트럭위에서 상하차작업 중

환풍에 부딪힘

안전대책

- 중량물 취급작업 작업계획서의 안전대책 수립
 - 중량물 취급작업계획서 작성 시 낙하·협착 등 안전대책에 관한 내용 포함이 되어 작성
- 중량물 취급 작업 시 작업지휘자 배치
 - 철판 등 중량물취급 작업의 작업계획서에 지정된 작업 지휘자는 현장에서 작업 지휘
- 작업표준(작업지침) 수립 및 준수
 - 가조립공정의 작업순서, 작업방법, 작업자간 역할, 볼트 너트의 체결 상태 확인 등 안전한 작업 절차를 수립하여 작업이 수행
 - 고용형태 구분 없이 작업자에게 충분히 주지시킨 후 작업
- 볼트·너트 체결 시 충분한 여유 나사 산수 확보 및 품질관리 철저
