


고소작업대 양중작업 중 떨어짐

공 사 명	○○ 공장 증축공사	발생일시	2018.10.12.(금) 09:40경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	인천시 연수구	공사규모	지상 4층 1개동
재해개요	2018년 10월 12일 09시 40분경 인천 연수구에 소재한 ○○건설에서 시공중인 『○○공장 증축현장』에서 협력업체 (주)장수플랜트 소속 근로자인 ○○이 2층 내부 소방 배관공사를 하기 위하여 이동식크레인으로 고소작업대를 양중하여 슬라브에 전륜바퀴를 지지한 상태에서 고소작업대에 탑승하여 운전하던 중 고소작업차가 슬라브로부터 이탈하여 약 7m 아래로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

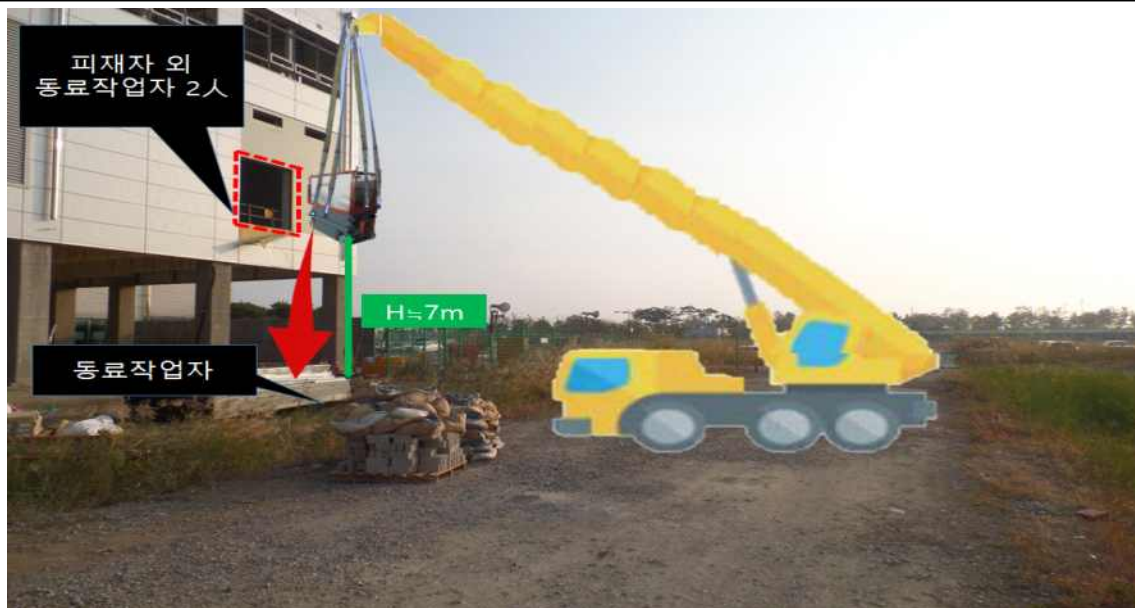

안전대책	○ 사전조사 및 작업계획서의 작성 등 - 사업주는 양중, 운반 등 중량물의 취급작업을 할 때에는, 근로자의 위험을 방지하기 위하여 사전에 해당 작업, 작업장의 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 차량계 건설기계의 종류 및 추락, 전도 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책 등을 포함한 작업 계획서를 작성하고 그 내용을 해당 근로자에게 알리고, 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함. ○ 작업지휘자의 지정 - 사업주는 중량물취급 작업계획서를 작성한 경우, 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 함.
------	--
