


비닐하우스 설치 중 작업대 개구부에서 떨어짐

공 사 명	비닐하우스 설치	발생일시	2019.06.23.(일) 10:30경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	인천시 옹진군	공사규모	비닐하우스 1동

재해개요

2019년 6월 23일(일) 10:30경 인천 옹진군 소재한 비닐하우스 설치 현장에서 00농자재 소속 000(만48세,남,비닐하우스공)가 비닐하우스 활대설치 준비작업 중 작업대로 사용하던 철재선반(가로 5.5m X 세로 4.5m, H≒2.6m) 위 걸쳐놓은 사다리가 미끄러지며 지상1층 바닥(H≒2.6m)으로 떨어져, 병원으로 후송 후 치료 중 2019년 6월 30일(일) 사망한 재해임.

재 해 상 황 도

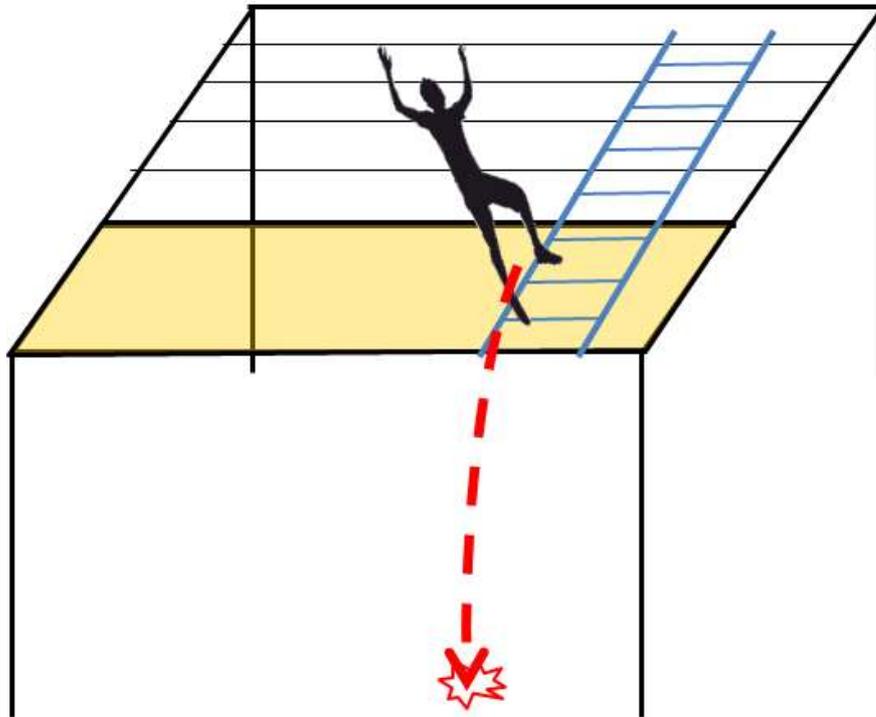

안전대책

○ 추락의 방지 실시

- 사업주는 작업자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계(飛階)를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 함.

○ 보호구의 지급 및 착용 실시

- 사업주는 작업자에 대해서는 작업의 구분에 따라 그 작업 조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 함.
