


창틀 하부에 올라서서 창틀 해체 중 떨어져 1명 사망

공 사 명	OO초등학교 외부창호교체 공사	발생일시	2017. 7. 8(토) 11:00분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산광역시 수영구 일원	공사규모	지상 3층 외부창호 교체 및 기타공사

재해개요

2017. 7. 8(토) 11:00경 부산광역시 수영구 소재 OO건설에서 시공하는 OO초등학교 외부창호교체 공사 현장에서 OO건설 소속 재해자(남, 59세, 해체공)가 창틀 하부에 올라서서 외벽에서 분리된 상부 창틀 절단 중 몸의 중심을 잃고 창밖 바닥으로 떨어져(H≈7.4m) 병원으로 이송하여 치료 및 요양 중 2017. 9. 7(목) 03:58분경 사망한 재해임

재 해 상 황 도

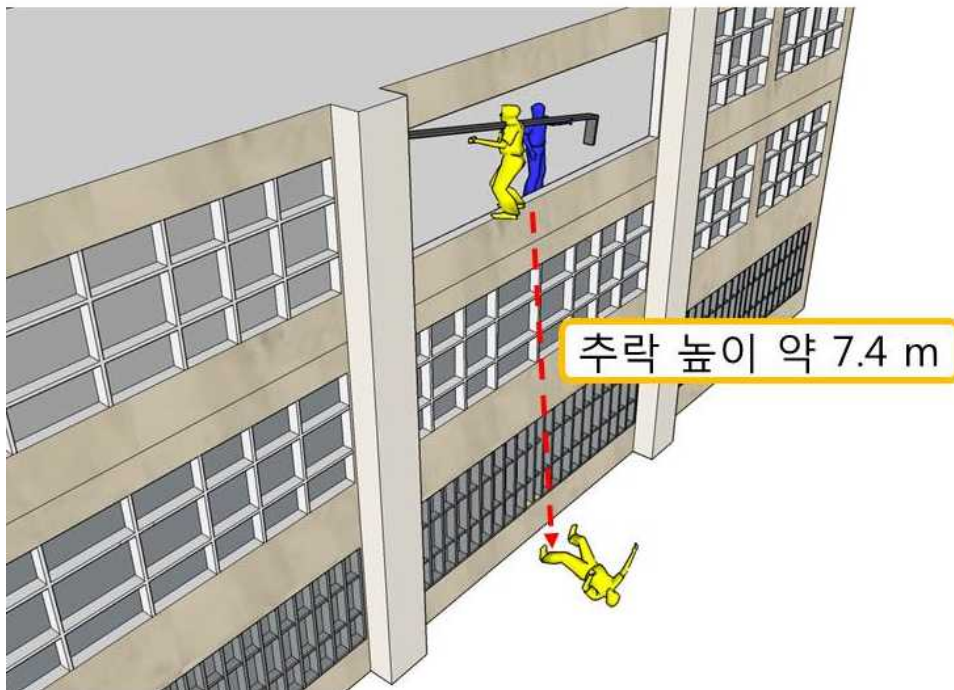

안전대책	○ 단부의 추락방지 조치 철저 - 3층 창틀 해체 작업시 창밖 외부로 추락할 위험이 있으므로 외부에 비계를 이용 안전한 작업 발판을 설치한다. - 비계 등의 설치가 곤란한 경우 건축물 내부 기둥 등에 안전대 부착 설비(안전블록+고정 앵커 등)를 설치하고 근로자에게 안전대를 지급하고 안전대를 부착한 상태로 작업을 실시하여야 한다.
-------------	--

재해발생 당시 해체하려고 한 상부 창틀



재해발생 당시 해체한 창틀



재해발생 당시 해체한 창틀



재해자 추락 위치(하부에서 촬영)



재해자 추락 위치(상부에서 촬영)




재해발생 후 현장 1



재해발생 후 현장 2



재해발생 후 현장 3

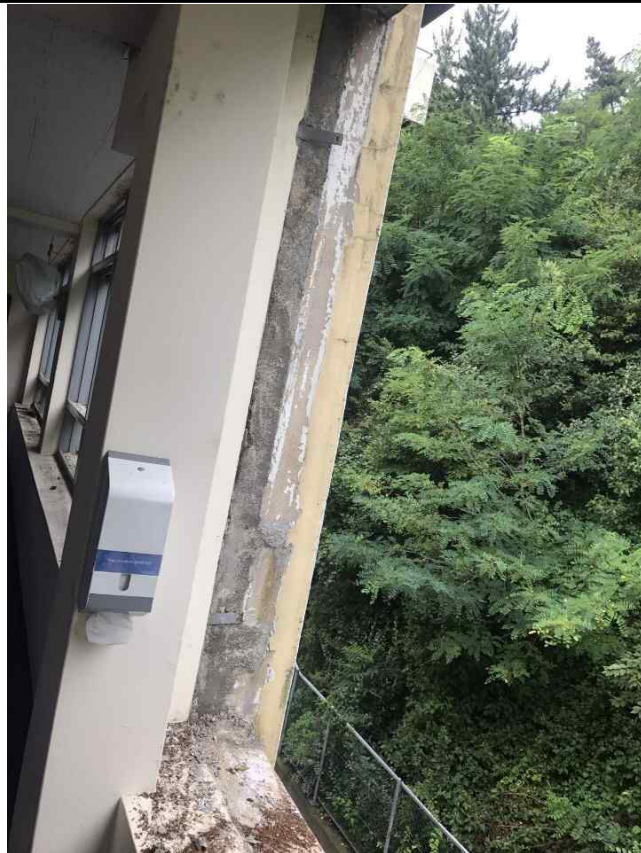

재해발생 후 현장 4
