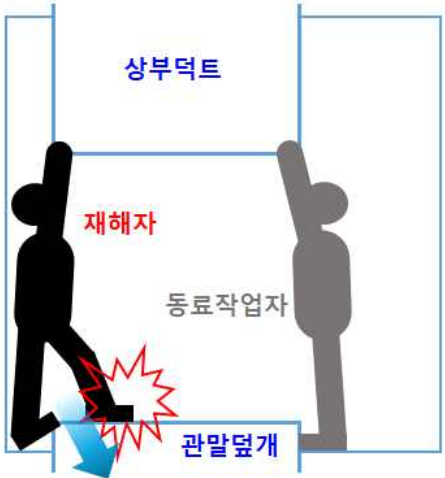
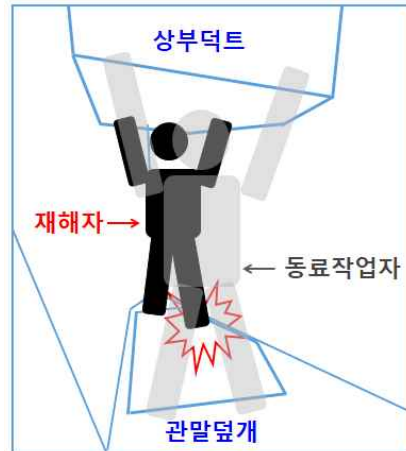


개구부 덮개가 뒤집히며 떨어짐

사업장명	0000	발생일시	2023. 3. 6.(월)
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	부산 00	공사규모	-
재해개요	○ 2023. 3. 6(월) 부산 000 신축공사 현장에서 ○ 지상 15층 제연덕트* 설치 작업 중 덕트 개구부(1.17×1.07m) 덮개가 뒤집히며 ○ 피해자가 지하 2층으로 떨어져(H≈52.8m) 사망한 재해임 * 제연덕트 : 시설물에 화재 발생 시 연기 등 유독물질을 밖으로 배출시키는 라인		
재해상황도			
			
안전대책	○ 개구부 덮개가 뒤집히지거나 떨어지지 않도록 고정하여 사용 - 관말덮개는 덕트슬리브를 충분히 덮을 수 있는 크기로 제작하고 나사못·볼트 또는 그 밖의 방법으로 고정하여 사용할 수 있도록 조치 ○ 개구부 덮개는 충분한 강도를 가진 구조로 제작 및 사용 - 반복 사용에도 덮개가 파손 및 변형되지 않도록 충분한 강도를 가진 구조로 제작 및 사용 ○ 개구부 덮개 사용 전 점검 및 정비 철저 - 관말덮개가 정상적인 상태로 사용될 수 있도록 사용 전 파손·변형 여부 등에 대한 점검 및 정비 실시		
