


찢어진 톤백의 손상부를 보수하던 중 전면 상단에 적재되어 있던 톤백이 무너지면서 깔려 사망 [사망1]

공 정 명	(주)OO 사료 톤백 입고	발생일시	2023. 6. 9.(금) 20:09경
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지	전북 군산시	공사규모	-
재해개요	'23.6.9.(금) 20:09경 **사료(주) 김제영업소 내 창고에서 재해자(화물차 지입차주)가 3톤 지게차로 톤백 사료 하차 작업 중에 찢어진 톤백의 손상부를 보수하던 중, 재해자의 전면 상단(3단)에 적재되어있던 톤백이 무너지며 재해자가 깔려 사망함.		

재 해 상 황 도

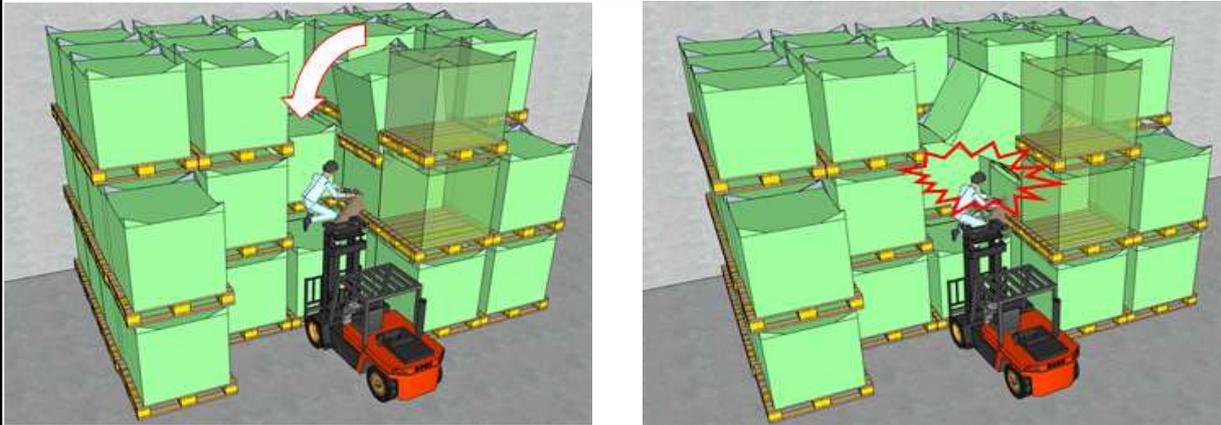

재해자가 톤백 1단에 올라가서 작업 중 옆 3단의 톤백이 무너지면서 깔림

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 적재된 화물의 전도방지조치 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 작업자가 맞거나 깔리지 않도록 적재방법을 변경하거나, 붙들어 지탱하여 기울어짐을 방지하는 등의 안전조치를 하여야 함. ○ 작업계획서 작성 및 작업지휘자 배치 <ul style="list-style-type: none"> - 추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험을 예방할 수 있는 안전대책과 운행경로 및 작업방법을 포함한 「작업계획서」를 작성하고, 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 작업지휘자를 배치하여야 함. ○ 위험성평가 및 교육 실시 철저 ○ 지게차 관리 및 사업장 시건 조치 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 운전 자격 없이 지게차를 운전하지 않도록, 지게차 시동키를 별도로 보관하고 업무시간 외에는 사업장 출입구를 시건조치 하는 등의 관리가 필요함. ○ (권장) 화물 적재 선반(일명, 파렛트랙) 설치
-------------	--
