
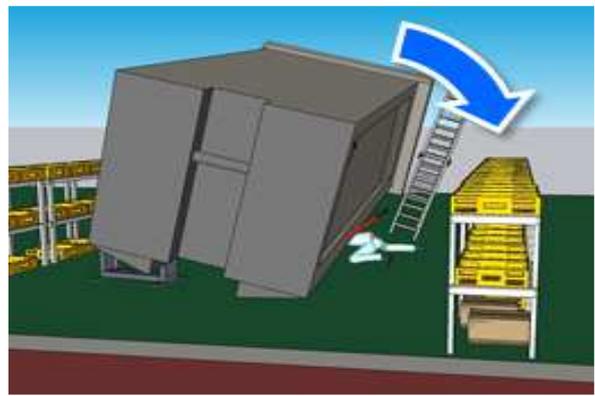


철제 받침대 위에 놓인 압롤박스 하부에서 작업 중 압롤박스가 바닥으로 넘어지면서 재해자가 깔려 사망 [사망1]

공 정 명	(주)OO 적제함 제작 공정	발생일시	2023. 6. 3.(토) 15:02경
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지	전북 김제시	공사규모	-
재해개요	'23.6.3.(토) 15:02경 김제시 소재 (주)***특장 공장 내에서 재해자가 철제 받침대 위에 놓인 압롤박스(무게 약 3톤) 하부에서 작업하던 중, 압롤박스가 바닥으로 넘어지며 재해자가 깔려 사망함. * 압롤박스: 압롤트럭의 적재함으로, 일반쓰레기 등의 폐기물을 적재하는데 사용됨.		

재 해 상 황 도

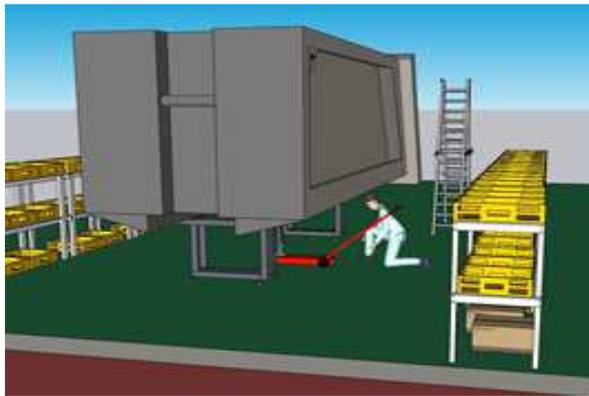

압롤박스 하부에서 작업 중

넘어지는 압롤박스에 깔림

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화물 전도방지조치 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 압롤박스가 받침대에서 이탈하며 전도되어 불시 낙하하지 않도록 천장크레인에 걸어 지탱하는 등의 안전조치를 하여야 함. ○ 작업계획서 작성 및 작업지휘자 배치 <ul style="list-style-type: none"> - 3톤의 중량물을 취급하는 작업에 대해 중량물의 추락·낙하·전도·협착·붕괴 위험을 예방할 수 있는 안전대책과 작업방법을 포함한 「작업계획서」를 작성하고, 작업지휘자를 배치하여야 함. ○ 위험성평가 및 교육 실시 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 압롤박스가 낙하 및 전도되어 근로자가 깔리거나 맞을 위험 등에 대한 유해·위험요인 및 감소대책을 수립하고, 그 결과를 근로자에게 교육하여야 함. ○ (권장) 하부 피트(PIT) 설치 및 안전성이 확보된 받침대 사용
-------------	---
