



중대재해 발생 알림

발표일시 : 2023년 6월 21일, 13:30

2023년 6월 17일 14:15경 경남 함양군 소재
위험절개지 정비 현장에서 벌목작업 중 쓰러지는
벌도목에 맞아 치료 중 6월 20일 사망



예방대책

- 수구(수거구)는 적정 높이 위치에 설치하고 기울기를 30도 이상으로 만듭니다.
- 벌목아래는 나무로부터 해당 나무 높이인 2배에 해당하는 직선 거리 안에서 다른 작업을 하지 않도록 관리합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

발보일시 : 2023년 6월 22일, 11:25

2023년 5월 16일 08:00경 경남 창원시 소재
철강 제조 공장에서 재해자가 기계 부품 교체
작업 중 기계 위에 적재된 파이프 다발이 무너지며
재해자가 파이프 다발과 기계 사이에 끼여 병원
에서 치료 중 6월 21일 사망



· 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지행하게
하는 등 안전 조치를 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

백포일시 : 2023년 7월 4일 13:20

2023년 7월 2일 09:22경 경남 남해군 소재 도서관 공사현장에서 옥상 바닥 누수 점검 작업 중 8m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 7월 3일 사망



예방대책

· 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 작업을 하는 경우 근로자에게 안전대를 착용시킨 후 안전대 부착 설비에 안전대를 체결하도록 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배보일시 : 2023년 7월 17일, 17:05

2023년 6월 13일 15:58경 경남 창원시 소재
공원 고사목 처리 현장에서 고사목 벌목 후
잔가지 정리 작업 중 쓰러지는 다른 고사목에
맞아 병원에서 치료 중 7월 17일 사망



예방대책

· 벌목 작업 중에는 벌목하려는 나무로부터 해당 나무 높이
2배의 직선거리 안에서 다른 작업을 하지 않도록 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 7월 19일, 10:30

2023년 7월 18일 14:57경 경남 창원시 소재
철강 공장에서 압연코일을 받쳐주는 가드 철판
(300kg)을 수리하는 작업 중 가드 철판이 앞쪽으로
기울어지며 작업자 2명이 깔림(사망 1명, 부상 1명)



예방대책

· 중량을 취급 작업 시 운행경로 및 작업방법 등에 대한 작업
계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 계획서대로 작업합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 7월 21일, 09:10

2023년 7월 20일 13:38경 경남 창원시 소재
전동기 공장에서 **도보로 이동 중인 재해자가**
지게차에 부딪혀 사망



예방대책

- 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 안전한 통로를 설치합니다.
- 지게차 사용 작업 시 운행경로 및 작업방법 등에 대한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 계획서대로 작업합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배고일시 : 2023년 7월 26일, 15:20

2023년 7월 26일 09:40경 경남 함안군 소재
야적장에서 재해자가 유로폼 운반작업 중 떨어지는
판넬 묶음(500kg)에 맞아 사망



예방대책

· 재물, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붓들어 자행하게
하는 등 안전 조치를 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

발포일시 : 2023년 8월 8일, 11:35

2023년 8월 7일 07:25경 경남 합천군 소재
고속국도 건설공사 현장에서 재해자가 작업을
마치고 나오는 덤프트럭에 부딪혀 사망



대중대역

차량계 하역운반기계를 사용하여 작업 하는 경우 근로자가
차량계 하역운반기계에 접촉되어 위험해질 우려가 있는
장소에 출입하지 않도록 관리합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 8월 14일, 17:30

'23년 8월 11일(금) 17:08경 경남 의령군 소재 계란
농장에서 **재해자가 계란 이송 엘리베이터 청소
작업 중 엘리베이터에 말리면서 끼여 사망**



예방대책

- 반드시 청소·정비·점검 작업 시 전원차단 등 사전 운전정지 실시하고 작업함 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 8월 16일, 13:50

'23년 8월 14일(월) 17:49경 창원시 소재 전통시장
에서 **지붕 차양막 보수 작업 중 8m 아래 지상
으로 떨어져 사망**



예방대책

- 안전모 및 안전대를 착용한 후, 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 안전하게 작업하여야 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

발포일시 : 2023년 9월 19일 15:20

'23년 9월 17일(일) 11:04경 경남 통영시 소재
신설 발전소 송전철탐 설치공사 중 80m아래
지상으로 떨어져 사망



여말다박

· 철탐조립 작업 시 안전대 부착설비 등 추락위험을 방지
하기 위한 조치 후 작업자는 안전대 고리를 부착설비에
반드시 체결하고 작업을 실시합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 9월 19일 16:10

'23년 9월 16일(토) 16:30경 경남 거제시 소재
시료보관시설 벽체 판넬 설치 작업 중 **이동식 비계**
에서 1.7m 아래로 떨어져 9.17. 치료 중 사망



예방대책

· 추락의 위험이 높은 이동식비계(2단) 작업 발판 단부에는 표준안전난간 설치하고 작업자는 안전모를 철저히 착용 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

발포일시 : 2023년 9월 20일 11:40

'23년 9월 19일(화) 11:35경 경남 고성군 소재 조선소에서 해양 플랜트 건조 작업 중 족장(발판) 철거하다 28m 아래로 떨어져 사망



예방대책

· 족장(발판) 철거 등 추락위험이 있는 장소에서 작업을 실시하는 경우 안전대부착 설비를 설치하고 안전대 고리를 확실하게 체결하고 작업하여야 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 10월 24일 09:30

'23년 10월 21일(토) 10:20경 경남 창원시 소재
상가건물 외벽 칼라강판 설치 작업 중 **재해자가**
사다리 최상단 발판에서 작업 중 1.4m아래
바닥으로 떨어져 사망



예방대책

- 사다리 작업시 안전모를 안전보호구를 반드시 착용하고
떨어질 위험이 있는 경우 2인1조로 작업 및 최상부 발판
에서 작업금지 합니다.




고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 10월 26일 16:00

'23년 10월 26일(목) 08:30경 경남 창원시 소재 금속절단 가공 공장에서 **재해자가 절단기 제품 배출구에 칩(Chip)을 제거하던 중 제품 이송 기계와 기둥 사이에 끼어 사망**

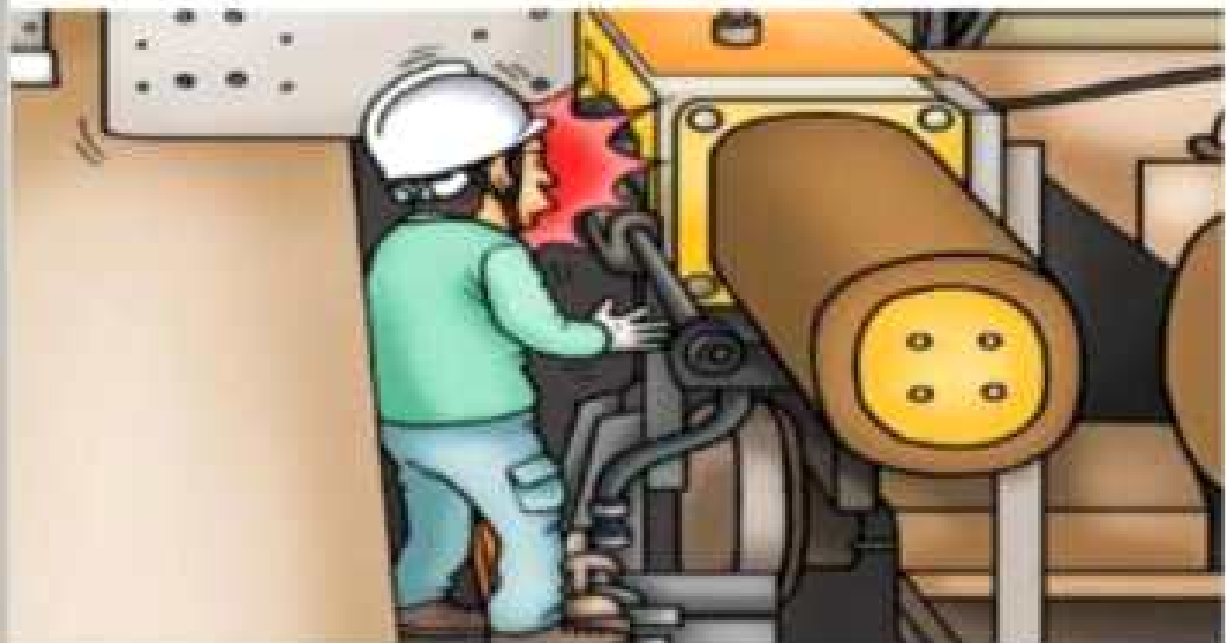

예방대책

- 기계 청소·점검 등을 실시하는 경우 반드시 전원 차단 및 운전 정지 및 방호조치(기동장치에 잠금 장치 설치 등) 후 작업을 실시 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 11월 3일 11:30

'23년 11월 2일(목) 19:30경 경남 함안군 소재
철구조물 제작 공장에서 **그라인더 작업 중인
재해자가 동료작업자가 운반 중이던 중량물(2톤)이
낙하하여 깔려 사망**



예방대책

- 물체가 용구를 사용하여 작업하는 경우 매 작업시작 전 점검하고, 중량물이 지나가는 경로 하부에서 작업을 실시하지 않도록 철저히 관리감독 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 11월 9일 10:00

‘23년 11월 7일(화) 19:45경 경남 고성군 소재 수출농업단지에서 선별포장 시스템 설치 작업 중 기존 설치되어 있던 **산업용 로봇과의 호환성 확인 중** 로봇이 작동하며 재해자가 끼여 사망



예방대책

- 로봇의 작동범위 내에서 수라검사조정·청소·금유 작업 시에는 로봇의 전원을 차단하고 다른 근로자의 조작을 차단한 후 작업 실시 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 12월 1일 17:30

'23년 7월 9일(일) 12:58경 경남 사천시 소재 수산
식품 제조공장에서 **천장 위 냉동 기계배관 철거
작업 중이던 재해자가 천장패널과 함께 3m
아래 바닥으로 떨어져 치료 중 11.26. 사망**



중요대역

- 안전대 부착상태 설치 후 작업자에게 안전대를 지급·착용하게 하고
안전대 고리 체결 여부 확인 등 관리요령을 철저히 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

발포일시 : 2023년 12월 05일 14:40

'23년 9월 4일(월) 13:00경 경남 함안군 철강공장
창고동 신축공사 현장에서 화물차로 **건축 자재를**
운반하던 재해자(운전기사)가 쓰러진 상태로 발견
(추락추정)되어 치료 중 11.29. 사망



예방대책

- 근로감독자는 위험수급작업시 작업방법 및 순서를 관리하여 안전하게 작업이 이루어 질 수 있도록 철저한 관리하고, 추적할 수 있는 위험요소
에서 작업 시 개인보호구(안전모)의 지급 및 착용 철저이 관리 됩니다.




고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 12월 1일 10:30

‘23년 11월 30일(목) 15:00경 경남 창원시 소재
공장 신축공사 현장에서 **연약지반 기초 파일 항타
작업 중 이어붙인 파일을 운반하다 용접 캡 부분이
파손되며 떨어지는 파일에 재해자가 맞아 사망**

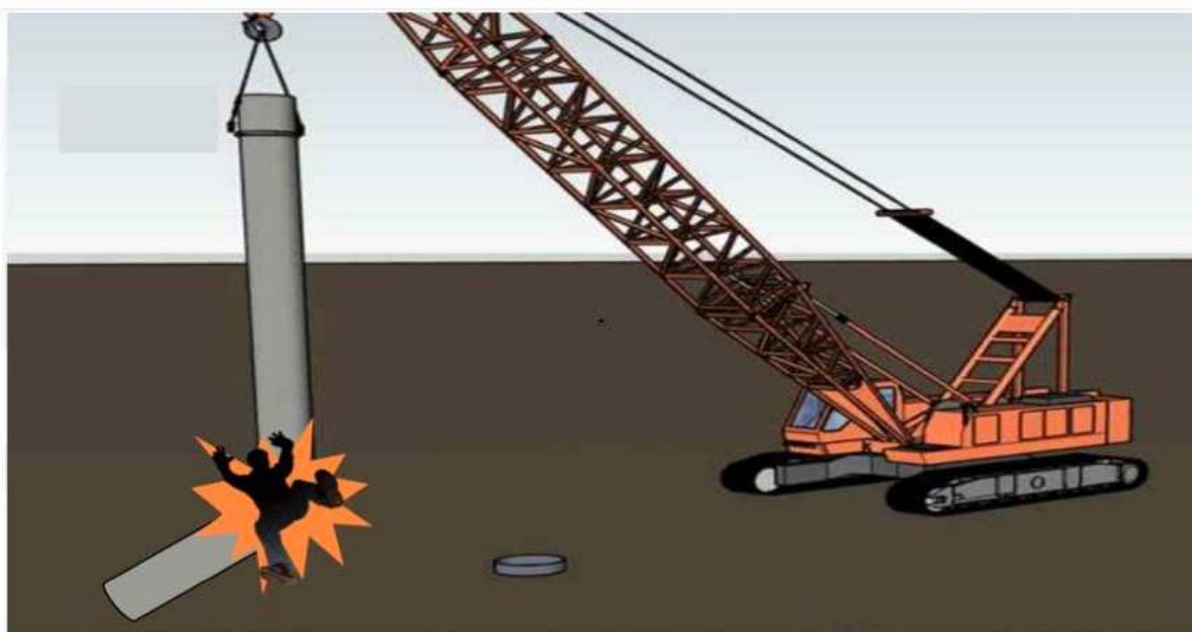

예방대책

· 작업 중 유도자를 배치하여 작업을 지휘하고 특히, 유도자는 위험반경 내 근로자의 접근을 철저히 통제하며 작업을 실시 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 12월 1일 13:30

‘23년 11월 30일(목) 16:13경 경남 함안군 소재
주물 공장에서 **천장크레인**으로 주물 제품 인양 중
달기구 체인이 터지며 재해자가 맞아 사망



예방대책

- 중량물 인양시 규격에 적합한 줄걸이 용구를 사용하고, 고리 걸이 용구(혹 등)는 주기적으로 점검하여 변형 시 사용금지 및 즉시 교체 하여야 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

백포일시 : 2023년 12월 08일 11:40

'23년 12월 07일(목) 13:00경 경남 거제시 소재 태양광 발전시설 설치공사 현장에서 공장 지붕에 올라가
**접지 작업 중이던 재해자가 채광창이
파손되며 17m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



예방대책


· 반드시 안전대 부착장비를 설치하고 작업자는 안전대를 착용하여, 취약한 지붕재, 채광창 등에 충분한 강도의 덮개와 폭 30cm 이상의 작업통로를 발판 설치 등 후작위형 방지조치를 반드시 실시 후 작업을 합니다.



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 12월 13일 10:30

'23년 11월 24일(금) 19:35경 경남 창원시 소재 자동차부품 제조 공장에서 산업용로봇에서 작업 중 이던 **재해자가 가동중인 로봇 설비에 끼여 치료 중 12.12 사망**

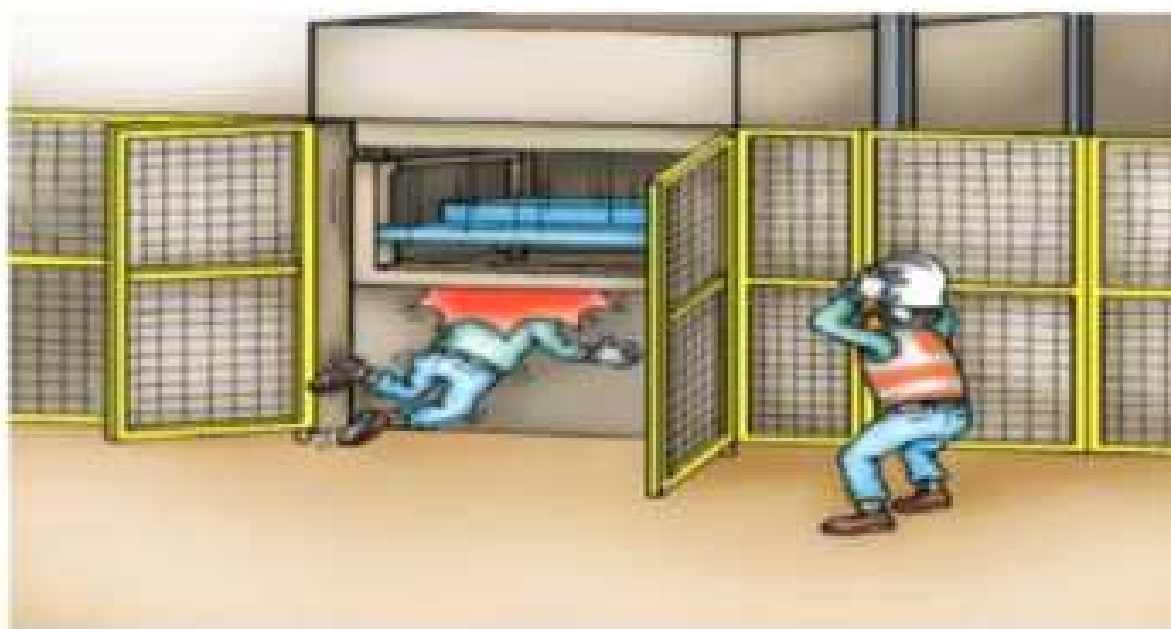

예방대책

· 산업용로봇 설비 내 끼임, 부딪힘 등의 위험이 있는 장소에 방책 및 감응식 방호장치를 설치하여 근로자의 출입을 제한하도록 철저하게 조치 합니다.



고용노동부



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2023년 12월 29일 14:10

‘23년 12월 28일(목) 14:30경 창원시 성산구 소재 폐기물 보관장에서 폐기물을 상차하는 과정에서 재해자가 집게차 집게(너클)에 끼여 사망



예방대책

집게차 작업시 협착 등의 위험 예방대책, 운행경로, 작업방법 등에 대한 작업계획서를 작성하고 근로자들에게 교육 후 작업계획서 대로 작업을 실시 하고, 작업지휘자 또는 산호수를 배치하여야 합니다.



고용노동부
